


河川事業 二級河川武庫川水系波賀野川(継続:再評価〔第2回〕)

位置図

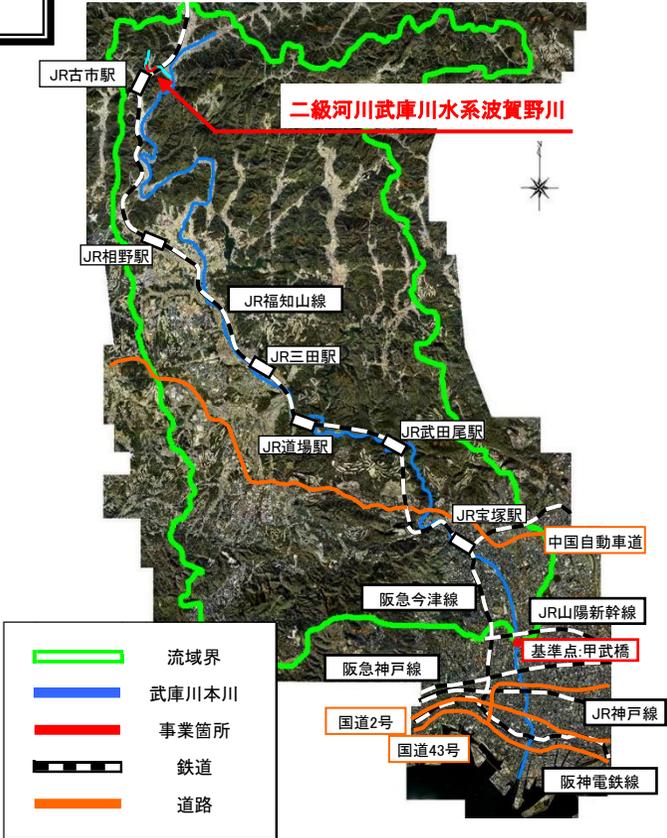


事業概要および進捗状況

工区	事業区間	整備内容	計画規模		今回評価時点	前回評価時点
武庫川水系	波賀野川	丹波篠山市 はがの波賀野 整備延長440m 河床掘削 3,500m ³ 護岸整備 3,000m ² 井堰改築 1基 橋梁架替 3橋	1/2	事業費	6.0億	4.0億
				残事業費	2.5億	2.5億
				進捗率	58.3%	37.5%
				完了予定年度	R10	R7

河川整備計画策定年度	平成23年度
前回評価年度	令和2年度
再評価年度	令和7年度

(二)武庫川水系河川整備計画に位置づけられた全ての事業によるB/C	12.4
-----------------------------------	------


横断図

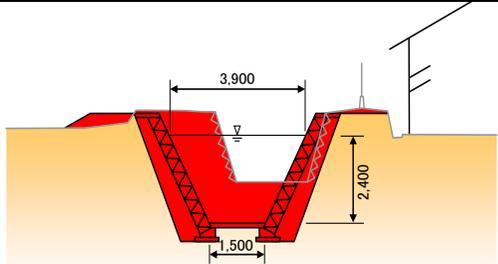

事業の目的、必要性・優先性

目的	武庫川水系河川整備計画に基づき、昭和36年6月洪水(戦後第2位の洪水)と同規模の洪水を安全に流下させる。
必要性 優先性	①目標流量25m ³ /sに対し、現況流下能力は約15m ³ /sであり、流下断面が不足している。 ②昭和58年、平成8年、16年、25年の洪水により、浸水被害を受けており、早期の治水安全度向上が求められている。

事業進捗平面図

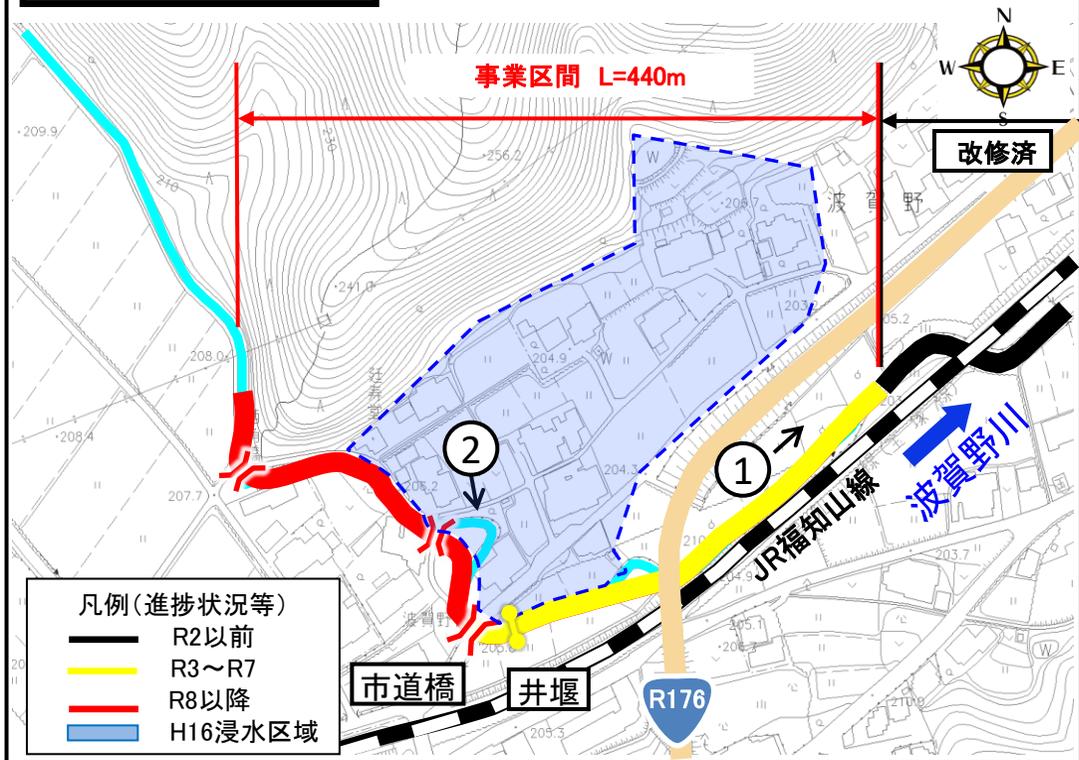

進捗状況

	事業進捗状況・予定	整備効果
全体 (H27~R10)	【事業費＝6.0億円】 ・整備延長 440m ・整備概要: 河床掘削、護岸、井堰改築、橋梁架替	流下能力の向上 (戦後第2位の洪水である昭和36年6月洪水を安全に流下)
事業採択～再評価まで (H27~R7)	【事業費＝3.5億円】 ・整備延長 270m ・整備概要: 河床掘削、護岸、井堰改築	
今後予定 (R8~R10)	【事業費＝2.5億円】 ・整備延長 170m ・整備概要: 橋梁架替、護岸	

現況写真

①完成区間 (JR近接部)



②残事業区間 (屈曲部)



工程表

■ : 前回計画
■ : 実施・計画

整備内容	前期								後期											
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12
調査設計					■	■														
用地補償					■	■	■	■	■	■										
築堤・護岸											■	■					■		■	
井堰											■	■			■					
橋梁架替													■	■						

再評価の経緯・結果

再評価に至る経緯等	・JR近接工事に伴い保安対策が必要となったこと、利水者との協議により井堰の構造を変更したことから事業費を増額する。 ・JR近接施工の協議に不測の期間を要し、工事着手が3年遅延したことから、完了予定年度を令和10年度とする。
再評価の結果	・事業の必要性は事業採択時と変わっておらず、地域住民の安心安全な生活環境を確保するため、事業を継続する必要がある。
